



Atto Protocollo  
Regio n. 2754  
del 13/04/2018

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

## DETERMINAZIONE N.3088 DEL 13-12-2018

**OGGETTO:** Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo complessivo pari ad € 2.230.000,00.  
Contratto sottoscritto tra Provincia di Benevento e Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. in data 13-08-2018, Rep. n.2707, Registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T.  
Liquidazione acconto al Consorzio dell'importo pari ad € 304.835,13 iva compresa.

**RIFERIMENTO CONTABILE:** Capitolo 13930 - Impegno n.1786/2018 (ex n.2898/2017)

**CUP:** I34H16000080001

**CIG:** 7092603925

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P. – P.O. DELEGATA

#### Premesso che

- a seguito degli eventi alluvionali del 15-20 ottobre 2015 la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n.464 del 19-10-2015, tra l'altro, ha conferito mandato al Presidente della Regione per richiedere al Consiglio dei Ministri la "Dichiarazione dello Stato di Emergenza nazionale", ai sensi dell'art.5 della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di 180 giorni (prorogati per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n.287 del 10-12-2015 sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- con Decreto Commissariale n.01 del 08-02-2016 è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- con Decreto Commissariale n.04 del 12-02-2016 sono stati individuati, tra l'altro, i soggetti attuatori per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvato lo schema tipo di convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore;
- con Decreto Commissariale n.9 del 25-2-2016 sono stati individuati gli interventi da attuare tra cui i lavori in oggetto riportati;
- con Decreto Commissariale n.14 del 25-2-2016 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'attuazione

- dell'intervento urgente Codice 00/U107 - "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00, mediante sottoscrizione di opportuna Convenzione tra il Commissario Delegato e la Provincia di Benevento;
- in data 29-02-2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, la Convenzione (Rep. n.06/A.P. del 29-02-2016) riguardante l'attuazione dell'intervento urgente di "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" riportante il Codice 00/U/107, per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00;
  - con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016 è stata approvata la convenzione sopra riportata, con contestuale variazione dei Programmi annuale e triennale dei LL.PP. della Provincia;
  - l'importo pari ad € 1.800.000,00, nel redigendo Bilancio 2016, è stato previsto in entrata al Capitolo 1758 e in uscita al Capitolo 13930 con impegno provvisorio n.60 del 18-03-2016;
  - per l'intervento di cui in oggetto è stato generato il seguente Codice CUP: I34H16000080001;
  - con Deliberazione del Presidente della Provincia n.69 del 15-04-2016, tra l'altro, è stato approvato il Progetto Preliminare Generale dei "Lavori per il ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", di importo complessivo pari ad € 5.000.000,00, redatto dagli uffici provinciali, nel quale venivano espressamente individuati, nella relazione e negli elaborati grafici, gli interventi da stralciare al fine di approntare celermente il progetto definitivo del primo lotto di tali lavori per l'importo stimato pari ad € 1.800.000,00, come previsto nel Decreto Commissariale n.14 del 25-2-2016 e nella Convenzione (Rep. n.06/A.P.) sottoscritta in data 29-02-2016 tra il Commissario Delegato ed il Presidente della Provincia di Benevento;
  - con la citata Deliberazione n.69/2016 è stato inoltre incaricato il R.U.P. di avviare celermente le procedure per la redazione del Progetto Definitivo dei lavori di che trattasi, da stralciare dal Progetto Preliminare Generale suddetto;
  - con Determinazione dirigenziale n.253 del 27-04-2016, tra l'altro, è stato affidata alla soc. I.TE.M.S. srl (Spin-off dell'Università del Sannio), in possesso dei requisiti di legge e di adeguata competenza professionale, la progettazione strutturale da redigere nell'ambito della progettazione definitiva;
  - acquisita la progettazione strutturale (in allegato alla nota I.TE.M.S. del 03-06-2016, assunta al protocollo dell'Ente con n.0047461 del 08-06-2016), i tecnici del Servizio Tutela Dell'Ambiente hanno provveduto alla redazione degli ulteriori elaborati necessari per la completa redazione del suddetto Progetto Definitivo successivamente approvato con Delibera Presidenziale n.94 del 14-06-2016, di importo complessivo pari ad € 2.230.000,00, e con contestuale richiesta al Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione di provvedere ad incrementare l'importo stabilito nel Decreto n.14 del 25-2-2016 di ulteriori € 430.000,00, in modo da assicurare alla Provincia il finanziamento dell'intera somma prevista nel Quadro economico del Progetto Definitivo (€ 2.230.000,00);
  - con Decreto Commissariale n.161 del 13-07-2016 il suddetto Progetto Definitivo, di Codice 00/U/107, è stato approvato anche dal Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione ancorchè privo del richiesto ulteriore finanziamento di 430.000,00 richiesto;
  - con Determinazione dirigenziale n.389/06 del 29-07-2016 è stata affidata, a conclusione di selezione informale, la progettazione esecutiva (da redigere sulla base del Progetto Definitivo approvato con Delibera Presidenziale n.94 del 15-06-2016 e, successivamente, con Decreto Commissariale n.161 del 13-07-2016) dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" allo Studio Associato Linear;
  - si è reso necessario revisionare il suddetto Progetto Definitivo a seguito di ulteriori indagini effettuate (in fase di esecuzione della progettazione esecutiva) sull'impalcato in acciaio del ponte;
  - attesa la irrecuperabilità dell'impalcato e di una delle due spalle del ponte esistente ed appurata l'equivalenza economica dei due interventi (progetto definitivo originario e progetto definitivo revisionato), in tempi strettissimi lo Studio Associato Linear, incaricato della progettazione esecutiva, ha completato la Revisione strutturale del Progetto Definitivo (approvato con Delibera Presidenziale n.94 del 15-06-2016 e, successivamente, con Decreto Commissariale n.161 del 13-07-2016), prevedendo nel contempo la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Ufita (Progetto Definitivo Revisionato consegnato con prot.0067876 del 14-10-2016 ed approvato con Delibera Presidenziale n.167 del 14-10-2016);
  - con la suddetta Delibera Presidenziale n.167 del 14-10-2016 è stata altresì reiterata la richiesta al Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione di provvedere ad incrementare l'importo stabilito nel Decreto n.14 del 25-2-2016 di ulteriori € 430.000,00, in modo da assicurare alla Provincia il

finanziamento dell'intera somma prevista nel Quadro economico (€ 2.230.000,00) "atteso che la carenza di fondi e la attuale impossibilità di approvare il Bilancio dell'Ente per i tagli conseguenti all'attuazione della L.56/2014 (Legge Delrio) rende nulla la possibilità della Provincia di intervenire con proprie risorse";

- in data 26-10-2016 (prot. n.0069720) si è tenuta, con esito favorevole, la Conferenza di Servizi al fine di acquisire pareri e valutazioni sul progetto definitivo revisionato di che trattasi;
- con Verbale di Verifica del 26-10-2016, prot. n.0069777, è stata effettuata la verifica del progetto definitivo revisionato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e degli artt. 44 e seg. Del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e s.m.i.;
- con Decreto Commissariale n.272 del 28-10-2016 il suddetto Progetto Definitivo Revisionato, di Codice 00/U/107, è stato approvato anche dal Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione ancorchè privo del richiesto ulteriore finanziamento di 430.000,00;
- in data 14-11-2016 con prot. n.0071802, in allegato alla nota di pari data dei progettisti, è stato acquisito il Progetto Esecutivo dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" redatto dallo Studio Associato Linear in conformità al Progetto Definitivo Revisionato approvato con Delibera Presidenziale n.167 del 14-10-2016 e con Decreto Commissariale n.272 del 28-10-2016;
- il suddetto Progetto Esecutivo, costituito da n.61 elaborati, presentava il seguente Quadro Economico (di importo complessivo dell'intervento ancora invariato e pari ad € 2.230.000,00):

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori	€ 1.616.804,93	
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 298.504,24	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 10.925,52	
a.4)	Oneri per la sicurezza indiretti	€ 6.033,63	
	Totale oneri della sicurezza (a.3 + a.4)	€ 16.959,15	
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.1 + a.4)</b>		<b>€ 1.622.838,56</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 - Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 128.000,00	
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 399.979,48	
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 607.161,44</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO</b>		<b>€ 2.230.000,00</b>

- con Verbale di Verifica del 14-11-2016, prot. n.0071844, è stata effettuata la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e degli artt. 44 e seg. Del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e s.m.i.;
- con Delibera Presidenziale n.173 del 14-11-2016 è stato stabilito quanto segue:
  - di approvare, in linea tecnica, il Progetto Esecutivo dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", di importo complessivo pari ad € 2.230.000,00, costituito da n.61 elaborati;
  - di dare atto che la suddetta spesa di € 2.230.000,00 trova copertura finanziaria parziale per € 1.800.000,00 nel

Bilancio 2016 (Cap. entrata n.1758 e cap. uscita n.13930 – Imp. provv. n.60/2016);

- di reiterare la precedente richiesta al Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione di provvedere ad incrementare l’importo stabilito nel Decreto n.14 del 25-2-2016 di ulteriori € 430.000,00, in modo da assicurare alla Provincia il finanziamento dell’intera somma prevista nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo pari ad € 2.230.000,00;
- con Determina dirigenziale n.519 del 18-11-2016 sono stati nominati il Direttore dei Lavori, i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- con Determina dirigenziale n.551 del 02-12-2016 sono stati nominati il Presidente ed i Componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo;
- con Determina dirigenziale n.552 del 02-12-2016 è stato nominato il Collaudatore Statico in corso d’opera;
- con nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell’Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, il Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015 ha comunicato l’incremento di ulteriori € 430.000,00 dell’originario finanziamento di € 1.800.000,00 avvenuto con la “Seconda Rimodulazione Complessiva del Piano dei primi interventi urgenti” elaborata dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n.298/2015 ed approvata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. RIA/0066411 del 30-11-2016;
- in data 14-03-2017, con prot. n.0011116, è stato assunto dalla Provincia il Provvedimento n.2017.0177135 del 10-03-2017 con il quale il Genio Civile di Benevento, attestando l’avvenuta istruttoria con esito positivo della documentazione progettuale strutturale, ha rinviato il rilascio del provvedimento formale di Autorizzazione Sismica alla individuazione del costruttore (a seguito di gara di appalto);
- in relazione alle interferenze dell’intervento approvato con la Progettazione Preliminare della tratta ferroviaria Apice-Orsara (Ordinanza del Commissario R.F.I. n.27 pubblicata sulla G.U.R.I. n.144 del 06-12-2016), in riscontro alla nota della Provincia prot. n.0005113 del 06-02-2017, R.F.I., con nota n.000331 del 08-05-2017 assunta al protocollo con n.00192250 in data 12-05-2017, ha comunicato, tra l’altro, l’assenza di motivazioni tecniche ostative alla realizzazione dell’intervento provinciale;
- con prot. n.19905 del 16-05-2017 è stata acquisita dall’Ufficio di Direzione Lavori la dichiarazione resa ai sensi dell’art.106 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 e ss.mm.ii.
- in data 16-05-2017, prot. n.0019946, è stato redatto e sottoscritto dal R.U.P. il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 dell’01-06-2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l’altro, di procedere all’indizione di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo;
- con Determinazione dirigenziale n.1533 del 12-07-2017 è stata nominata, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto, per le attività di verifica ed esame delle domande di partecipazione e della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle rispettive offerte, nonché per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche;
- la Commissione Giudicatrice ha formalizzato le proprie operazioni con n.30 Verbalì (dal n.1 del 13-07-2017 al n.30 del 14-11-2017) ed in particolare, nel verbale di gara n.30 del 14-11-2017, ha compilato la graduatoria dei punteggi complessivi, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
- la Commissione Giudicatrice, a seguito di verifica dell’anomalia per il concorrente primo in graduatoria effettuata con le procedure di rito, nella successiva seduta pubblica di gara del 23-03-2018, ha stabilito:
  - di escludere dalla gara il provvisorio primo classificato, ai sensi dell’art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, per le motivazioni di cui alla nota del R.U.P. prot. n.10990 del 15-03-2018;
  - che, a seguito di tale esclusione dalla gara, il concorrente risultante collocato al miglior posto in graduatoria era il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni, Società Consortile a Responsabilità limitata, con sede in Torrecuso (BN), via Rivolta, snc;
  - di prendere atto che l’offerta del Consorzio S.A.C. Costruzioni non risultava anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta tempo) non risultavano, entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- con Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018 di aggiudicazione definitiva è stato stabilito quanto segue:
  1. di approvare i verbali di gara delle sedute della Commissione Giudicatrice, dai quali risulta che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621), si è collocato a primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo riparametrato pari a 93,676, di cui punti

75,00 per l'offerta tecnica, punti 7 per l'offerta tempo e punti 11,676 per l'offerta economica corrispondente al ribasso del 23,102%;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29, iva esclusa;
3. di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA		
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>	
a.1)	Lavori	€ 1.616.804,93
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 298.504,24
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 10.925,52
a.4)	A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)	€ 373.514,27
a.5)	Importo lavori a seguito di ribasso	€ 1.243.290,66
a.6)	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 6.033,63
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>	<b>€ 1.249.324,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 - Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 126.779,74
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 310.397,39
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 516.359,09</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>	<b>€ 1.765.683,38</b>
	IMPORTO INTERVENTO PRE GARA	€ 2.300.000,00
	<b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>	<b>€ 464.316,62</b>

4. di dare atto altresì che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. risulta aggiudicatario per le società consorziate di seguito indicate: Car Segnaletica stradale, con sede in Ponte - BN alla C.da Piana Zona Industriale snc, p.iva 014049090622; Alpin s.r.l., con sede in Torrecuso - BN alla Via Rivolta snc, p.iva 01293400626; Sicurbau s.r.l., con sede in Torrecuso - BN, alla Via Rivolta snc, p.iva 02477240218;

- il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. in data 13-08-2018, rep. n.2707, registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;

#### Dato atto che:

- ✓ in data 25-07-2018, con nota prot. n.0028373, il R.U.P. ha effettuato la "notifica preliminare" dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- ✓ in data 25-07-2018, in attesa della consegna da parte dell'impresa dei documenti necessari al perfezionamento del provvedimento di autorizzazione sismica, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge ed in particolare "la consegna delle lavorazioni previste nel cronoprogramma allegato all'offerta migliorativa ad eccezione delle opere strutturali oggetto del provvedimento di autorizzazione sismica";
- ✓ con nota n.070-18 del 31-07-2018, l'impresa ha chiesto l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art.3.15 del Capitolato Speciale di Appalto;
- ✓ con nota n.US/2018/112/SAC/NM/fa del 05-10-2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-10-2018 con n.0034860, l'impresa ha comunicato il "concreto inizio dei lavori" a partire dal 08-10-2018;

5

- ✓ con nota n.US/2018/115/SAC/NM/fa del 09-10-2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 15-10-2018 con n.0035822, l'impresa ha nominato il Direttore Tecnico di Cantiere;
- ✓ con nota n.US/2018/170/SAC/NM/fa del 06-11-2018, inviata tramite pec del 07-11-2018, l'impresa ha sollecitato l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art.3.15 del Capitolato Speciale di Appalto;
- ✓ con nota-pec del 15-11-2018, la Direzione dei Lavori ha comunicato al RUP l'effettivo inizio delle lavorazioni consegnate;
- ✓ l'art.3.15 del Capitolato Speciale di Appalto, tra l'altro, testualmente recita "*Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 percento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori*";
- ✓ l'erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell'art.4 del Contratto sottoscritto in data 13-08-2018, rep. n.2707, registrato a Benevento in data 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T, previa costituzione da parte dell'impresa di "*ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori*";

#### **Atteso che:**

- ❖ come riportato all'art.8 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 130.950,00 a mezzo polizza fideiussoria n.2018/13/6402968 emessa in data 08-06-2018 dalla società "Italiana Assicurazioni s.p.a.";
- ❖ come riportato all'art.9 del citato Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.2018/25/6094732 emessa in data 28-05-2018 dalla società "Italiana Assicurazioni s.p.a.";
- ❖ in allegato alla nota n.121-18 del 11-10-2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 11-10-2018 con n.0035529, l'impresa ha trasmesso polizza fideiussoria n.2018/13/6418505 emessa in data 10-10-2018 dalla società "Italiana Assicurazioni s.p.a. a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;
- ❖ l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT4B0514215000CC1511157029 relativo al c/c aperto presso la Banca di Credito Popolare) e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.5 del Contratto;
- ❖ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 1.524.175,63, di cui € 1.249.324,29 per lavori (compreso € 6.033,63 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 274.851,34 per iva al 22%;
- ❖ il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come acquisito dai seguenti DURC On Line:
  - n.INAIL\_13641797 con scadenza 26-02-2019, per Consorzio S.A.C.
  - n.INAIL\_13527880 con scadenza 19-02-2019 per C.A.R. Segnaletica Stradale s.r.l.
  - n.INAIL\_13528234 con scadenza 19-02-2019 per Alpin s.r.l.
  - n.INAIL\_13528284 con scadenza 19-02-2019 per Sicurbau s.r.l.;
- ❖ in data 06-12-2018 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.41516, la fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018 di importo complessivo pari ad € 304.835,13 (di cui € 249.854,86 per competenze ed € 54.970,27 per iva al 22%), emessa dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;


#### **Ritenuto:**

pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento richiesto dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018, di importo complessivo pari ad € 304.835,13;

#### **Visti**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16-05-2016;
- le Ordinanze del C.D.P.C. n.298 del 17-11-2015 e n.303 del 03-12-2015;
- i Decreti del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione n.01 del 12-02-2016, n.09 del 25-02-2016 e n.14 del 25-02-2016;

- o la Convenzione, rep. n.06/A.P. del 29-02-2016, sottoscritta in data 29-02-2016 tra Il Commissario Delegato ed il Presidente della Provincia di Benevento;
- o la Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016;
- o la Determina dirigenziale n.151 del 17-03-2016;
- o le Delibere Presidenziali n.69 del 15-04-2016, n.94 del 14-06-2016 e n.173 del 14-11-2016;
- o i Decreti del Commissario Delegato n.161 del 13-07-2016 e n.272 del 28-10-2016;
- o la nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, del Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015;
- o la nota del Genio Civile di Benevento prot. n.0011116 del 14-03-2017;
- o la dichiarazione dell'Ufficio di Direzione Lavori prot. n.19905 del 16-05-2017, ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 e ss.mm.ii.;
- o il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo prot. n.0019946 del 16-05-2017;
- o il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- o la Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 del 01-06-2017;
- o la Determinazione dirigenziale n.1533 del 12-07-2017;
- o la Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018;
- o il Contratto sottoscritto il 13-08-2018, rep. n.2707, reg. a Benevento il 13-09-2018 al n.7318 Serie 1T;
- o la Determinazione del Direttore Generale n.2604 del 07-11-2018 con la quale al Responsabile del Servizio "Tutela dell'Ambiente e Ciclo Rifiuti", ing. Gennaro Fusco, è stata attribuita delega delle funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

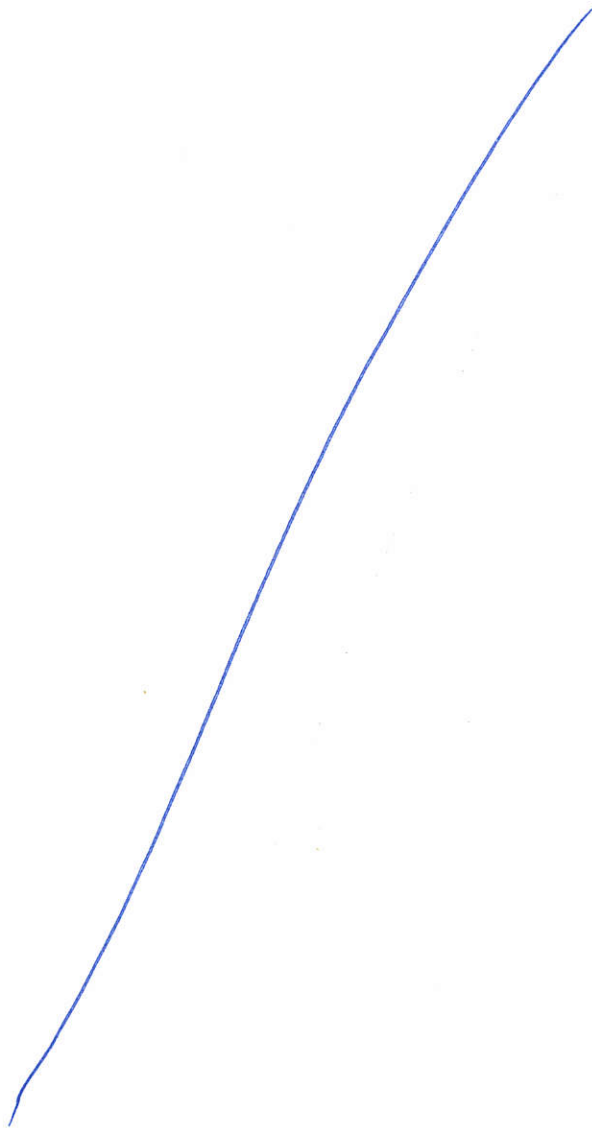



## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di liquidare** a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo complessivo pari ad € 304.835,13 (di cui € 249.854,86 per competenze ed € 54.970,27 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018 di pari importo totale, emessa dal citato Consorzio per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- 2) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento dei seguenti importi:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 54.970,27 a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018;
  - a favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., p.iva 01666280621, con sede in Via Rivolta snc – Torrecuso (BN), l'importo pari ad € 249.854,86, a fronte della fattura elettronica n.12/18 del 28-11-2018, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato al suddetto Consorzio presso la Banca di Credito Popolare con Codice IBAN:  
IT4B0514215000CC1511157029;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 304.835,13 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione dirigenziale n.1066 del 14-05-2018 di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione a seguito di gara di appalto;
- 4) **di dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 304.835,13 è assicurata dall'impegno n.1786/2018 (ex n.2898/2017) tratto sul cap.13930;
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - R.U.P.  
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE  
(Ing. Gennaro Fusco)

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore 42736 liq. n. 5128

Cod. Creditore 17 DIC 2018 liq. n. Mod. 5494

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe Creta)

Rev 4346
